

都市計画道路荒地西山線整備事業 小林工区の進捗状況と今後のスケジュール

都市安全部 道路建設課

1 進捗状況

平成7年3月に阪神間都市計画道路事業の認可を受け事業着手しており、地域住民の方々の調整や用地取得の難航、阪急今津線立体交差形式の見直し、千種側の地中障害物除去や汚染土壌処分の追加などで期間を要したため、これまでに事業認可期間を5回延伸し、令和9年3月末の完了を目指して取り組んでいる。

工事については、昨年7月に本線トンネル区間のボックスカルバートが完成し、現在は同区間西側の掘割区間の擁壁築造工事を行っており、本年11月末に完成する予定である。

また、用地取得については、事業用地面積あたりで99%を取得しており、引き続き工事進捗に併せながら残りの用地取得を進めていく。

2 今後のスケジュール





事業の加速化を図るため、現在行っている工事に引き続き、本線残りの擁壁築造工事を一括施工し、本線大型構造物を令和6年3月末に完成させる予定としている。その後、南北の側道や歩道工事、本線の仕上げ工事などを切れ目なく行い、事業認可期間内の完了を目指している。

なお、裏面の図面に計画スケジュールを示している。

都市計画道路荒地西山線（小林工区）

区画整理事業区域

整備区間 L=633m W=18~27m

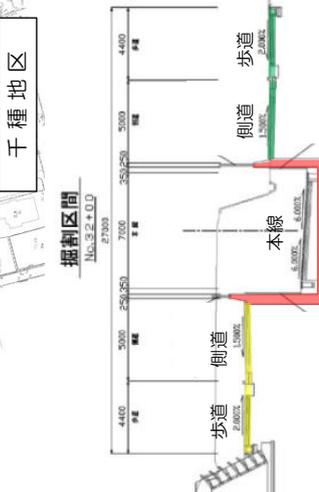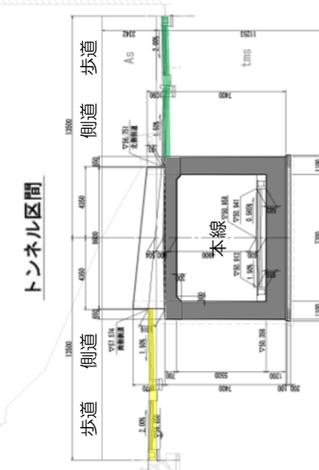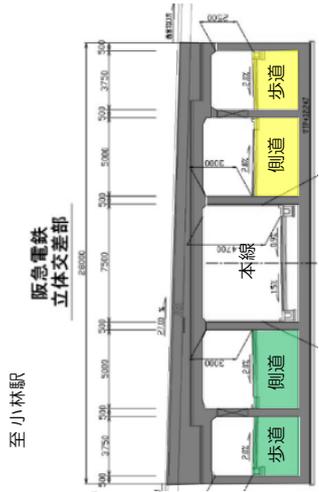

区分	工事	整備済	施工中	本工事 (R4~5)	R6	R7	R8
		■	■	■	■	■	■
							仕上り工事 (道路施設・区画線等)
