

議案第17号
平成31年度宝塚市水道事業会計予算


資料4 管路等の耐震化の進捗状況

1 管路の耐震化の状況

(1) 基幹管路耐震化率(φ150mm以上の管路を対象)

基幹管路延長 L=345,515m(平成29年度末)


	平成28年度末	平成29年度末	平成30年度末(見込)	平成31年度末(見込)
目標値	13.4%	14.9%	17.8%	20.7%
実績値	11.9%	13.4%	14.3%	15.1%

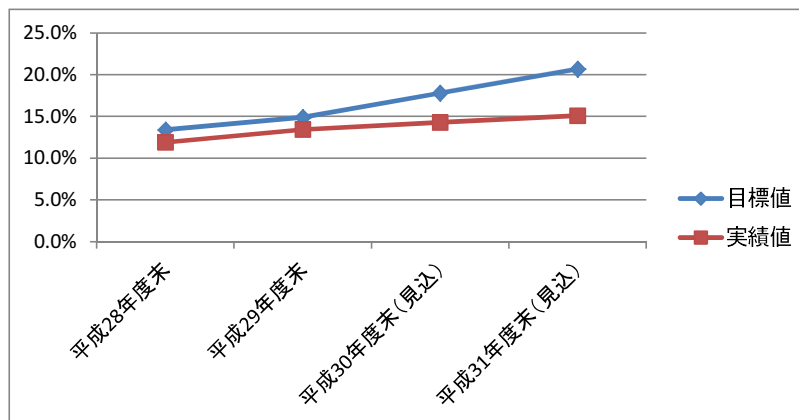

(2) 管路耐震化率(全管路対象)

全管路延長 L=804,708m(平成29年度末)

	平成28年度末	平成29年度末	平成30年度末(見込)	平成31年度末(見込)
目標値	8.2%	8.8%	10.1%	11.3%
実績値	8.0%	9.3%	9.7%	10.5%

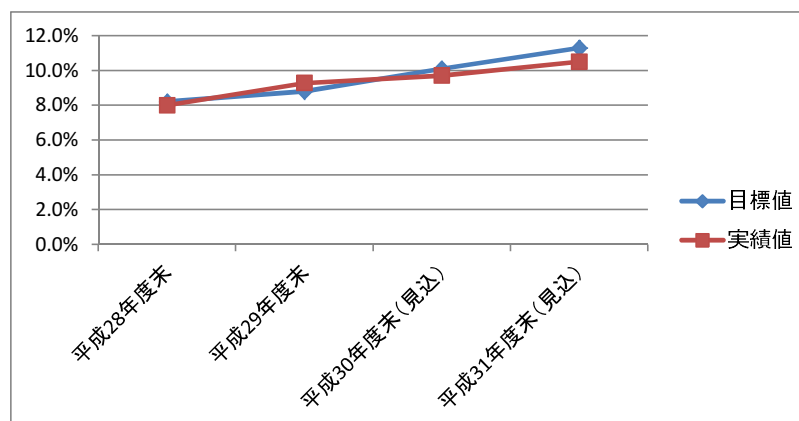


2 基幹施設の耐震化の状況

(1)配水池

耐震化対象配水池数：45ヶ所


		平成28年度末	平成29年度末	平成30年度末(見込)	平成31年度末(見込)
耐震化済箇所数		10	11	12	13
耐震化率(容量比)	目標値	45.2%	45.2%	52.2%	52.2%
	実績値	40.7%	45.5%	47.0%	51.2%

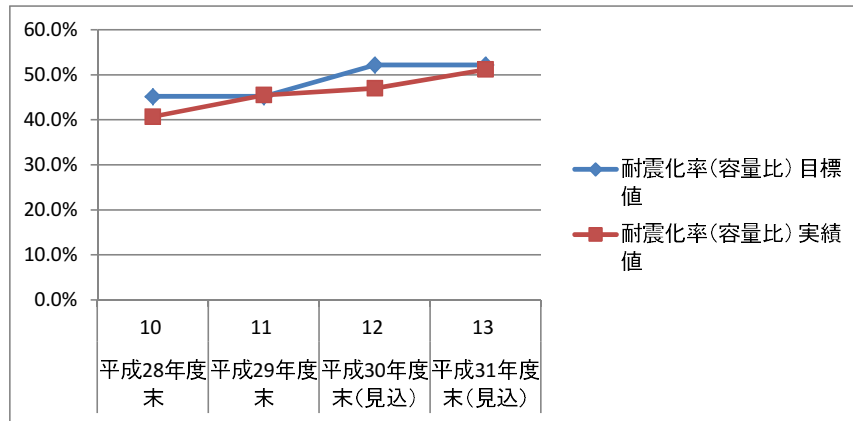

(2)加圧所

耐震化対象加圧所数：29ヶ所

		平成28年度末	平成29年度末	平成30年度末(見込)	平成31年度末(見込)
耐震化済箇所数		10	10	12	13
耐震化率(能力比)	目標値	18.1%	18.1%	24.1%	24.1%
	実績値	18.9%	18.9%	23.7%	27.6%

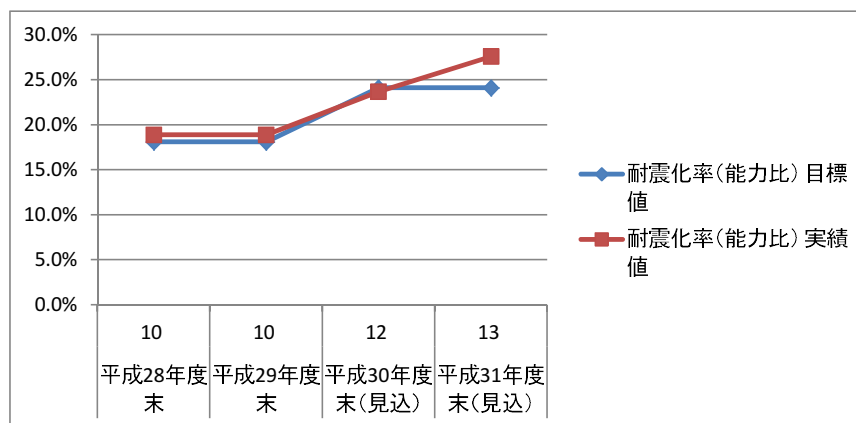

※ 目標値＝水道事業経営戦略の目標値
