
議案第16号 令和2年度宝塚市水道事業会計予算

資料6 新庁舎建設事業の今後のスケジュール等

1 整備スケジュール

今年度、新庁舎整備工事の入札が不調に終わったことを受け、今後整備計画を進める上で新庁舎等建設設計自体を大きく見直すこととし、建物の構造を鉄筋コンクリート造へと変更すること、ピロティー部分の床面積を減少させ、当初2期であった工事期間を1期とすることなどの方針を決め、現在、その方針に沿った基本設計及び実施設計に取り掛かっています。また、現在の上下水道局庁舎は耐震性能が不足しており、早期に新しい建物へ移転する必要がありますが、見直し後の新庁舎整備計画では、上下水道局が新庁舎へ移転できる時期は令和5年1月以降となっています。

それまでの間、安心して市民に来庁いただけることや、職員が安心して業務が行えるよう、 リースによる仮設庁舎の整備を決定し、令和3年1月の移転を目指して取り組んでいます。 建設に係るスケジュールは以下のとおりです。

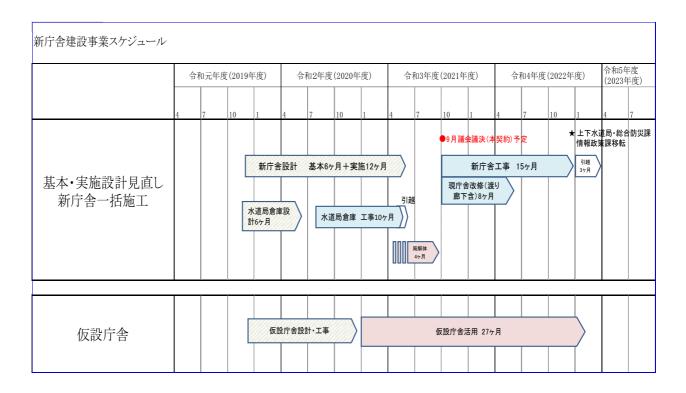

2 令和2年度の事業予算

上下水道局

・新庁舎基本・実施設計委託料
・倉庫基本・実施設計委託料
・倉庫建設費
10,632 千円
14,388 千円
133,320 千円
(合計) 158,340 千円

(日前) 156,540 | 円

・仮設庁舎用建物賃貸借料(令和3年1~3月分) 23,254千円

市

新庁舎基本・実施設計委託料

14,228 千円

3 新庁舎配置図及び仮設庁舎配置図

資料その2新庁舎配置図及び資料その3仮設庁舎配置図をご覧ください
