

議題第17号

令和2年度宝塚市下水道事業会計予算

資料3 管路の耐震化の進捗状況


(1) 重要な管路の耐震化率（主要汚水幹線及び軌道、河川横断箇所）

管路延長 L=6,966m（平成30年度末）

	平成29年度末	平成30年度末	令和元年度末（見込）	令和2年度末（見込）
目標値	31.3%	36.6%	43.1%	47.4%
実績値	30.6%	30.6%	34.1%	54.3%

※目標値は、下水道事業経営戦略の目標値

（経営戦略との比較グラフ化）

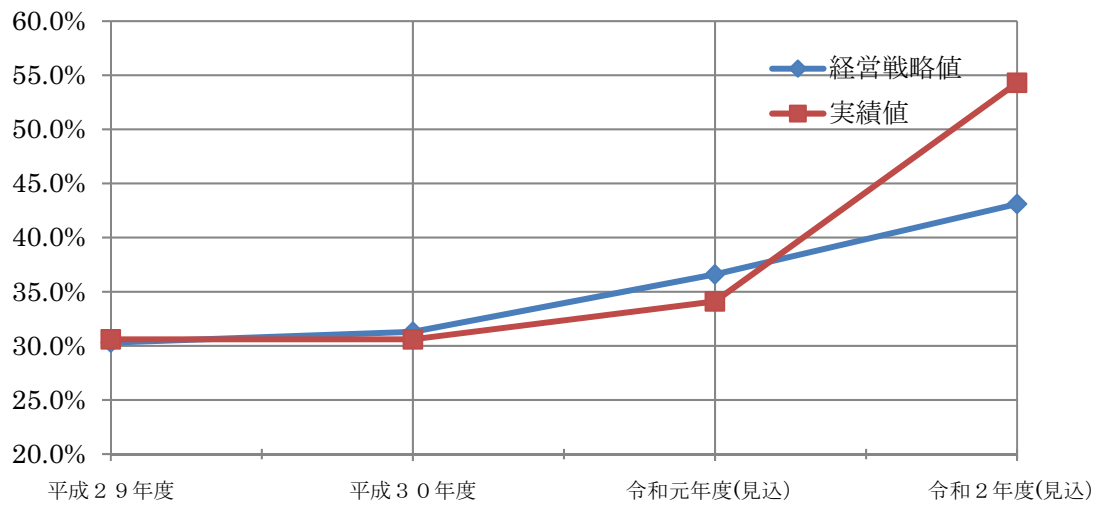

(2) 汚水管路全体の耐震化率（全管路対象）

全管路延長 L=517,896m（平成30年度末）

	平成29年度末	平成30年度末	令和元年度末（見込）	令和2年度末（見込）
目標値	19.3%	19.5%	19.6%	20.5%
実績値	19.8%	20.1%	20.2%	20.5%

※目標値は、下水道事業経営戦略の目値

（経営戦略との比較グラフ化）

