配水池統廃合事業（右岸地区）について

新北畑加圧所集約に係る施設整備計画

【目的】

武庫川右岸地区において、水運用の効率化や維持管理費の低減を図ります。また、本事業の実施にあわせて、対象施設の耐震化を図り持続可能な施設の構築に取り組みます。

【事業概要】

北畑加圧所、旭ガ丘加圧所および生瀬浄水場（ポンプ設備）の３施設を、新設する新北畑加圧所の１施設に集約を図ります。


北畑加圧所
旭ガ丘加圧所
生瀬浄水場
→ 廃止（既存の加圧所の用途は新北畑加圧所に集約）

北畑加圧所ポンプ　２台
旭ガ丘加圧所ポンプ　５台
生瀬浄水場ポンプ　４台
１１台
→ 廃止（新北畑加圧所ポンプ ６台 に既存の用途を集約）

配水池統廃合事業（右岸地区）について

新北畑加圧所集約に係る施設整備計画

【事業の概要図】

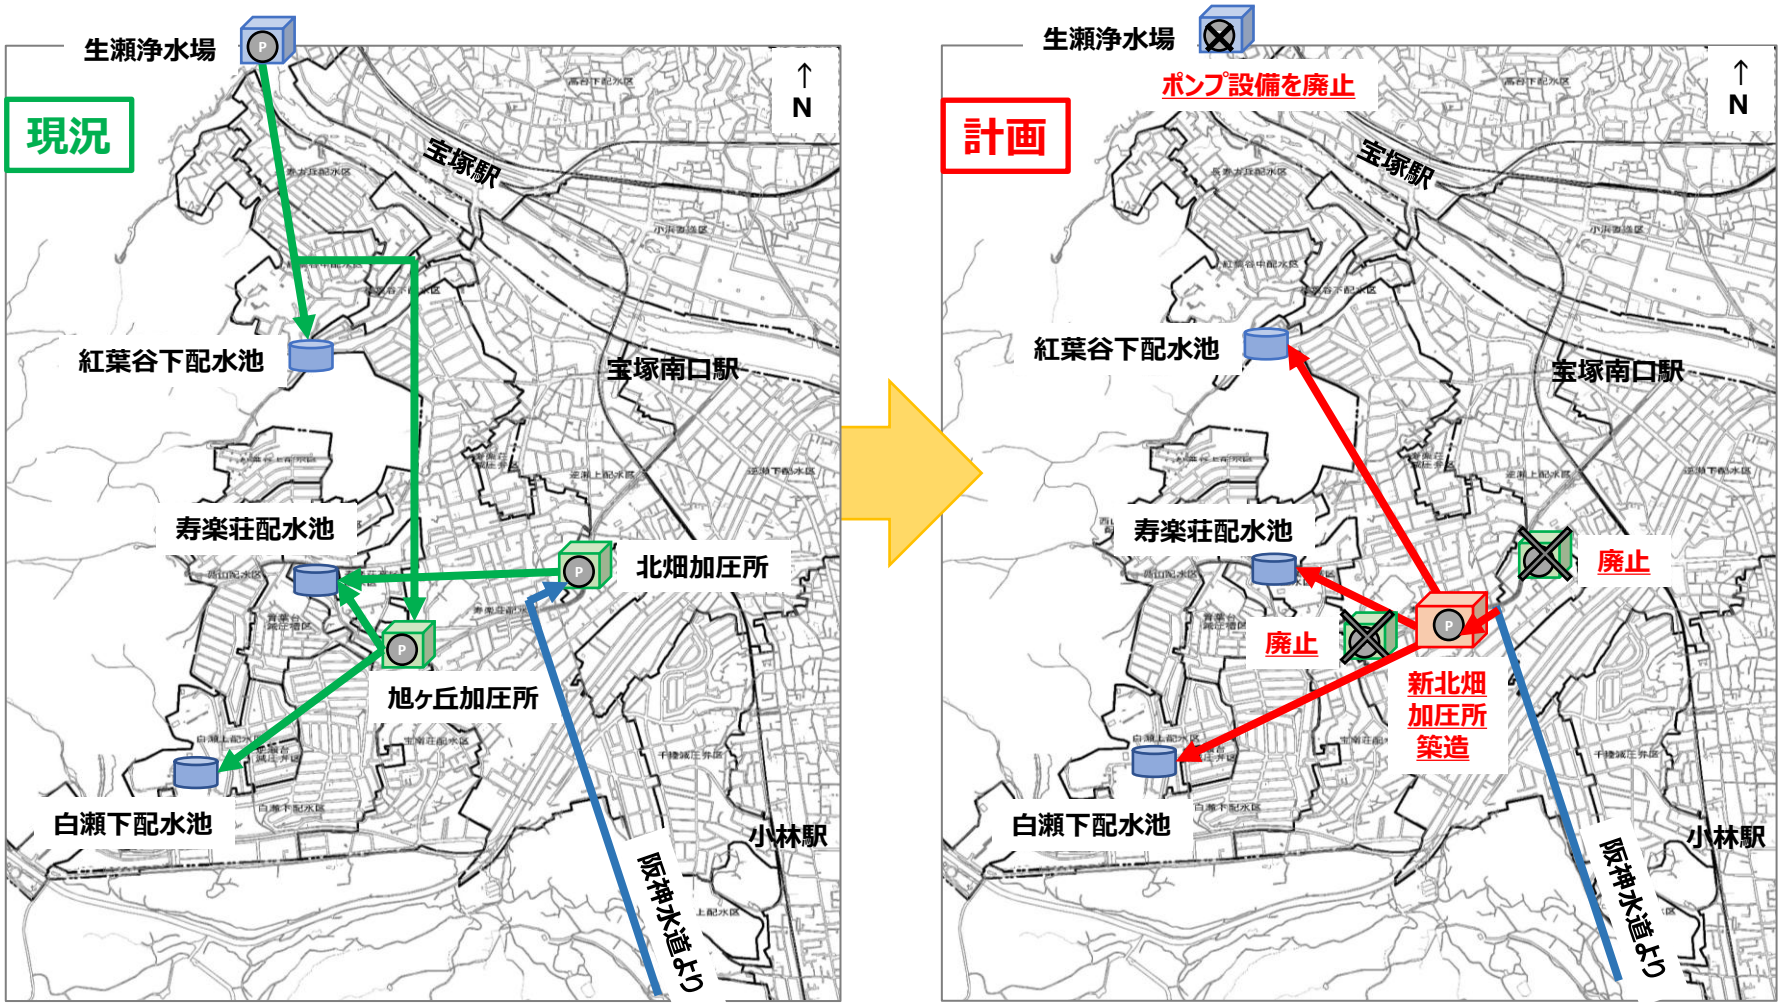

配水池統廃合事業（右岸地区）について

新北畑加圧所集約に係る施設整備計画

【工程】

内容・年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
測量・設計	→	→	→	→	→			
送水管工事（白瀬下配水池行き）					⇢	⇢	⇢	
送水管工事（寿楽荘配水池行き）					⇢	⇢	⇢	
送水管工事（紅葉谷下配水池行き）					⇢	⇢	⇢	
新北畑加圧所築造工事						⇢	⇢	

※ 工程は社会情勢などにより変更となる場合があります。
