

議案第152号

令和2年度 宝塚市一般会計補正予算（第8号）

資料1（3・4） 補正予算の概要（新庁舎・ひろば整備事業）

1 補正予算要求額及び実施内容

歳出

(1) 事業活用調査委託料：2,000 千円

・国補助事業の最終年度に実施する必要がある事後評価にかかる費用

(2) ひろば整備工事費：82,000 千円

・ひろば造成工事及びひろば全体の植栽工事（下記平面図の太線箇所）

歳入


・新庁舎・ひろば整備事業債 72,500 千円

2 要求理由

今回補正予算で要求しているひろば整備工事等については、国の社会資本整備総合交付金を活用し、今年度内に事業を完了させる必要がありましたが、新庁舎建設工事の入札不調の影響を受け、関連する上下水道局倉庫棟工事が令和3年度までずれ込むことから、工事時期の調整が必要なひろば造成工事及び植栽工事は、令和3年6月以降にしか着手できなくなり、今年度内での完了が困難となりました。

そのため、国に補助対象期間の延長を令和3年度まで認めてもらい、補助金の活用を図ることができるようになったため、今年度の事業費（令和元年度からの繰越予算として）のうち、既に執行した事業費を除いた、整備工事費82,000千円及び事業活用調査委託料2,000千円を執行せずに、改めて補正予算として要求するものです。

3 要求箇所

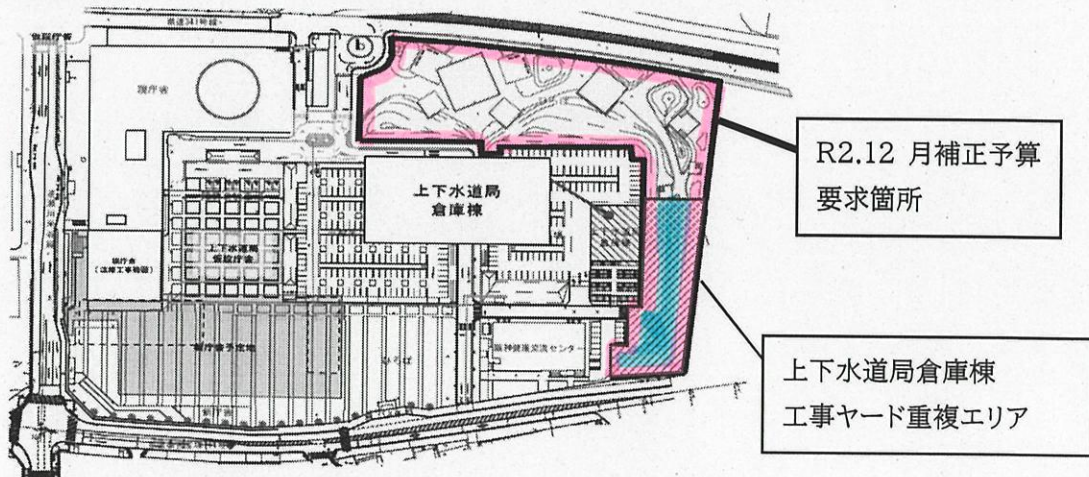

4 スケジュール

	令和元年度	令和2年度	令和3年度
変更前	倉庫棟工事	ひろば造成工事 植栽工事	
変更後		倉庫棟工事	ひろば造成工事 植栽工事
